

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

Plan de administración del proyecto

Integrantes,

Andrés Felipe Pinzón Márquez

Daniel Felipe Ramirez Vargas

Guillermo Andrés Aponte Cardenas

Miguel Ángel Sarmiento Cuervo

Fecha, 9 de noviembre de 2026

1. Historial de Cambios - La evolución de nuestro documento

Fecha	Autor	Descripción
26/10/2026	Daniel Ramírez	Creación de la estructura y redacción inicial del PMP con portada, índice y secciones de la plantilla SPMP, a partir del contexto del proyecto, la adaptación de estándares, la documentación del servidor y el canvas del equipo.
27/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	Actualización de portada y formato; revisión integral de contenido, estructura de títulos, referencias y terminología FDS/WFDS.
28/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	Revisión de contenido, actividades, responsabilidades, formación, infraestructura y referencias del PMP.
29/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	Actualización de los títulos de las secciones.
06/11/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	Resolución de pendientes, actualización de objetivos y fuente de igniciones de la sección 6.2.

2. Prefacio - ¿Para qué y para quién hacemos este plan?

Este Plan de administración del proyecto organiza el trabajo necesario para desarrollar, comprobar y entregar la aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá. Su propósito es relacionar el alcance del producto con los entregables, la organización del equipo, los recursos y los mecanismos de seguimiento, de manera que las decisiones técnicas y las actividades de software produzcan resultados identificables. El periodo administrado por este plan corresponde al primer semestre de 2027, cuando se realizarán las fases de Construcción y Transición, mientras que el trabajo de Inicio aporta los antecedentes y las condiciones de preparación. La visión se presenta en la sección 6.1, el modo de trabajo en la sección 8, la ejecución en la sección 9 y el seguimiento y soporte en las secciones 10 y 12. Esta organización adapta la estructura de la plantilla SPMP a un proyecto académico con trabajo iterativo e incremental [1][2].

El documento está dirigido principalmente a Andrés Pinzón, Daniel Ramírez, Guillermo Aponte y Miguel Sarmiento, así como al director Jaime Andrés Pavlich Mariscal y a los asesores que acompañen su desarrollo. Las personas que participen como usuarios o aporten infraestructura encontrarán las condiciones que afectan su intervención en las secciones correspondientes.

3. Tabla de Contenidos - Una ruta para recorrer el documento

1. Historial de Cambios - La evolución de nuestro documento **2**

2. Prefacio - ¿Para qué y para quién hacemos este plan? **3**

4. Lista de Figuras - ¿Dónde encontrar las figuras del proyecto? **9**

5. Lista de Tablas - ¿Dónde encontrar cada tabla? **10**

6. Vista General del Proyecto - De los escenarios de incendio a una aplicación de escritorio **11**

6.1. Visión del Producto - Explorar escenarios para apoyar al comandante 11

6.2. Propósito, alcance y objetivos generales y específicos - ¿Qué vamos a construir y hasta dónde llegaremos? [Pendientes: 1. Precisar las coordenadas exactas del sector de Aguas Claras. 2. Precisar horizontes de consulta, compatibilidad y agregación de escenarios, entrada de datos y tamaño de la biblioteca.] 11

6.2.1. Objetivo general 12

6.2.2. Objetivos específicos 12

6.3. Supuestos y Restricciones - Las condiciones que hacen viable el proyecto [Pendientes: 1. Actualizar disponibilidad y preparación de datos. 2. Comprobar recursos HPC.] 13

6.4. Entregables del proyecto - Los siete productos que vamos a entregar [Pendientes: 1. Acordar fechas y cantidades. 2. Precisar destinatarios y responsables de cada entrega.] 13

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto - El tiempo y los recursos detrás de la entrega [Pendientes: 1. Elaborar cronograma de 2027-1 con fechas, duraciones, hitos y dependencias. 2. Estimar costos, consultar tarifas HPC-ZINE y consolidar presupuesto y flujo de caja.] 15

6.6. Evolución del Plan - ¿Cómo cambia el plan cuando cambia el proyecto? [Pendientes: 1. Definir responsables y autoridad de aprobación. 2. Acordar momentos de revisión.] 15

7. Glosario - Un lenguaje común para entendernos **17**

8. Contexto del proyecto - ¿Cómo vamos a trabajar y con quién? **18**

8.1. Modelo de Ciclo de Vida - Preparar, construir y entregar con DAD [Pendientes: 1. Acordar duración y agenda de iteraciones. 2. Definir flujo de revisión. 3. Definir las prácticas que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto, incluidas las técnicas de seguimiento, desarrollo y pruebas.] 18

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué pasamos de RUP a DAD? [Pendientes: 1. Completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles. 2. Definir y documentar las prácticas específicas de desarrollo que se utilizarán en el proyecto.] 18

8.2. Lenguajes y Herramientas - Las herramientas que conectan simulación y software [Pendientes: 1. Elegir tecnologías de aplicación y pruebas y proveedor de API. 2. Fijar versiones. 3. Configurar repositorio y reglas de Git. 4. Confirmar acceso documental definitivo y recursos HPC. 5. Buscar y recopilar referencias bibliográficas oficiales, manuales de usuario y documentación técnica de todas las herramientas y lenguajes utilizados, incluidos FDS, Smokeview, UML, Git, GitHub, Aldine, LaTeX, Docker Compose, Nginx, Tailscale, Linux y Slurm.] 19

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué elegimos FDS, UML, Aldine y Git? [Pendientes: 1. Actualizar el análisis de alternativas y justificación conforme a la resolución del pendiente 1 de la sección 8.2. 2. Investigar y comparar alternativas a UML. 3. Investigar y comparar alternativas a Git.] 20

8.3. Plan de Aceptación del Producto - Comprobar el producto con quienes lo usarán [Pendientes: 1. Hablar con la directora de Bomberos de Bogotá para acordar su participación en la aceptación del producto. 2. Acordar criterios medibles, métodos de comprobación, tolerancias y responsables.] 20

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación - Las personas que harán posible el proyecto 21

8.4.1. Interfaces Externas - El vínculo con usuarios, academia y HPC [Pendientes: 1. Confirmar participación de John Jairo Corredor Franco. 2. Identificar usuarios evaluadores. 3. Precisar los datos de contacto y medios de comunicación de todas las personas y entidades participantes.] 21

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles - ¿Quién se ocupa de cada responsabilidad? [Pendientes: 1. Designar coordinador. 2. Elaborar organigrama. 3. Asignar actividades, revisiones, medición y riesgos.] 21

9. Administración del Proyecto - Convertir el alcance en un plan de trabajo 23

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación - Estimar antes de comprometer tiempo y recursos [Pendientes: 1. Identificar las estimaciones requeridas en las diferentes secciones del PMP. 2. Definir los métodos y herramientas que se utilizarán para realizar cada estimación. 3. Documentar los datos, supuestos y procedimientos que fundamentarán los cálculos realizados.] 23

9.2. Inicio del proyecto - Prepararnos antes de construir 23

9.2.1. Entrenamiento del Personal - Aprender FDS y prepararnos para usar HPC [Pendientes: 1. Confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC. 2. Acordar agenda, tareas, criterios de aprendizaje, evidencia y revisión.] . 23

9.2.2. Infraestructura - El entorno para ejecutar nuestras simulaciones [Pendientes: 1. Confirmar acceso, cuotas, almacenamiento y tarifas HPC-ZINE. 2. Verificar versión, instalación, configuración y ejecución efectiva de FDS en HPC-Zine. 3. Elegir sistema operativo y entornos de desarrollo de la aplicación. 4. Investigar y precisar los procedimientos, requisitos y actividades necesarios para obtener acceso individual a HPC-Zine.] 23

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto - Organizar las actividades para llegar a la entrega [Pendientes: 1. Completar planificación de 2027-1.] 24

9.3.1. Descomposición de Actividades - Descomponer el trabajo de una iteración [Pendientes: 1. Elaborar el WBS de 2027-1 para una iteración y establecer sus dependencias.] 24

9.3.2. Calendarización - Dar orden y tiempo al trabajo [Pendientes: 1. Elaborar la carta Gantt de 2027-1 con fechas, duraciones y dependencias, detallando las actividades repetitivas de una sola iteración, y elaborar un diagrama BPMN para representar el flujo recurrente de trabajo. 2. Acordar iteraciones, agenda, revisiones y periodos de corrección. 3. Establecer la actualización de la carta Gantt en cada entrega para reflejar el avance real del proyecto.] 25

9.3.3. Asignación de Recursos - Vincular cada actividad con los recursos que necesita [Pendientes: 1. Una vez elaborada la WBS, identificar los recursos necesarios y los roles requeridos para ejecutar cada actividad principal.] 25

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación - ¿Cuánto cuesta realizar el proyecto? [Pendientes: 1. Consultar y confirmar las tarifas de HPC-Zine. 2. Valorar esfuerzos y aportes financieros y en especie por actividad. 3. Elaborar y justificar el presupuesto. 4. Elaborar una tabla de flujo de caja que detalle las entradas y salidas de dinero para las principales actividades identificadas en la WBS.] 25

10. Monitoreo y Control del Proyecto - Saber dónde estamos y qué debemos ajustar 26

10.1. Administración de Requerimientos - Mantener conectadas las necesidades y el producto [Pendientes: 1. Consolidar los objetivos y requisitos a partir del VFP. 2. Definir los participantes, responsabilidades, autoridad de aprobación y momentos de revisión de cambios. 3. Elaborar un diagrama BPMN que represente el proceso de administración de requerimientos y la creación o actualización de sus artefactos.] 26

10.2. Monitoreo y Control de Progreso - Seguir el avance con requisitos, tareas y pruebas [Pendientes: 1. Acordar los responsables del monitoreo y control del progreso. 2. Definir las métricas y unidades de seguimiento del proyecto y relacionarlas con los métodos de estimación de la sección 9.1 una vez completada. 3. Establecer las acciones correctivas ante desviaciones del progreso, sus responsables y los procedimientos para su aplicación y seguimiento, en relación con la sección 8.4.2.] 27

10.3. Cierre del Proyecto - Evaluar, corregir y cerrar la entrega [Pendientes: 1. Confirmar fechas y responsables.] 28

11. Entrega del Producto - Entregar la aplicación, la biblioteca y su documentación [Pendientes: 1. Acordar las fechas y el medio de entrega. 2. Definir el procedimiento y los responsables del empaquetado y la presentación.] 29

12. Procesos de Soporte - Cuidar el trabajo que sostiene el producto 30

12.1. Ambiente de Trabajo - Trabajar juntos también requiere acuerdos 30

12.2. Análisis y Administración de Riesgos - Anticipar lo que puede poner en riesgo la entrega [Pendientes: 1. Elaborar la descripción del plan de administración de riesgos, indicando el responsable y las actividades necesarias para ejecutarlo. 2. Elaborar un diagrama BPMN del proceso de administración de riesgos y su correspondiente explicación. 3. Elaborar una tabla con los riesgos identificados, indicando su probabilidad de ocurrencia e impacto, y ordenándolos por prioridad a partir de ambos factores. 4. Elaborar una segunda tabla con los riesgos más importantes y las acciones de prevención correspondientes a cada uno. 5. Considerar en la identificación de riesgos las incertidumbres relacionadas con los datos de entrada, la ejecución de FDS, el acceso y capacidad de HPC-Zine y la comprobación de la agregación de escenarios.] 30

12.3. Administración de Configuración y Documentación - Conservar versiones coherentes de nuestros artefactos [Pendientes: 1. Definir cambios, ramas, versiones, integración, nomenclatura y almacenamiento pesado. 2. Asignar administración, revisión, aprobación y restauración. 3. Comprobar servicio y recuperación y definir respaldo del repositorio de la aplicación.] 31

12.4. Métricas y Proceso de Medición - Medir lo que hacemos para orientar las decisiones 32

12.5. Control de Calidad - Revisar y comprobar lo que vamos construyendo [Pendientes: 1. Identificar, describir y explicar los procesos de control y aseguramiento de calidad que se aplicarán al proyecto, incluyendo verificación, validación, revisiones, auditorías, revisiones de calidad de documentos, pruebas unitarias, pruebas de sistema y evaluaciones externas, entre otros. 2. Elaborar una tabla que presente cada proceso de calidad, su nombre, una breve descripción y el momento del proyecto en que se realizará. 3. Describir detalladamente el procedimiento de cada proceso de calidad mediante diagramas BPMN. 4. Establecer los responsables de ejecutar, supervisar y comprobar cada proceso de calidad.] 33

13. Anexos - El material que complementa nuestro plan [Pendientes: 1. Revisar documentos HTML para anexar.] **34**

14. Referencias - Las fuentes que dan sustento al documento **35**

4. Lista de Figuras - ¿Dónde encontrar las figuras del proyecto?

1. Ciclo de vida adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2]. 18

5. Lista de Tablas - ¿Dónde encontrar cada tabla?

1. Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2][3]. 13

2. Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 14

3. Marco temporal de referencia. Fuente: metodología del equipo [2]. 15

4. Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan. 17

5. Participantes externos y ámbitos de relación. Fuente: identificación de participantes del proyecto. 21

6. Actividades principales del proyecto y su descripción. Fuente: elaboración propia. 24

7. Indicadores de referencia para el seguimiento del progreso. Fuente: adaptación al proyecto de las dimensiones de seguimiento. 28

8. Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 31

6. Vista General del Proyecto - De los escenarios de incendio a una aplicación de escritorio

6.1. Visión del Producto - Explorar escenarios para apoyar al comandante

La herramienta de simulación empleada en el proyecto es *Fire Dynamics Simulator* (FDS). Históricamente, *Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator* (WFDS) surgió como una extensión de FDS para modelar incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades fueron posteriormente integradas en FDS. En este documento, FDS designa el software utilizado, mientras que WFDS se emplea para hacer referencia específica a dichas capacidades de simulación en contextos forestales, sin implicar el uso de un simulador independiente [4][5].

La aplicación ofrecerá al comandante o coordinador de la operación una forma de explorar posibles comportamientos del incendio mediante resultados de simulación preparados con anterioridad, de modo que pueda consultar y comprender información georreferenciada sin configurar directamente el modelo científico durante el incidente. La aplicación se concibe exclusivamente para escritorio y combina una biblioteca de escenarios FDS con una consulta en la que el comandante marca manualmente la ubicación o el perímetro observado del incendio. Las condiciones meteorológicas se obtendrán mediante una API; si el servicio no está disponible, el comandante podrá diligenciarlas manualmente. El diseño contempla seleccionar escenarios compatibles, agregar resultados desde el borde activo, excluir el interior identificado como quemado y presentar mediante Smokeview una animación georreferenciada que pueda actualizarse cuando existan nuevas observaciones. La biblioteca y la aplicación también podrán utilizarse como material de capacitación.

El cambio esperado es facilitar la interpretación de escenarios dentro de las condiciones representadas y comunicar sus límites de forma comprensible. Por ello, el producto apoyará el juicio del usuario y no emitirá decisiones operativas automáticas ni garantizará una predicción exacta. La evaluación del producto toma como base la evaluación con usuarios y la trazabilidad descritas en la sección 8.3, y los fundamentos de calidad de la sección 12.5. La corrección del software se distingue de la evidencia científica que respalda los resultados.

6.2. Propósito, alcance y objetivos generales y específicos - ¿Qué vamos a construir y hasta dónde llegaremos? [Pendientes: 1. Precisar las coordenadas exactas del sector de Aguas Claras. 2. Precisar horizontes de consulta, compatibilidad y agregación de escenarios, entrada de datos y tamaño de la biblioteca.]

El propósito del proyecto es desarrollar una aplicación de escritorio que permita consultar y visualizar posibles comportamientos de incendios mediante escenarios FDS precalculados, para apoyar al comandante o coordinador de la operación. El alcance técnico comprende la delimitación precisa de Aguas Claras, sector de los Cerros Orientales de Bogotá, la preparación de datos, la configuración y ejecución de simulaciones FDS, la construcción y catalogación de la biblioteca de escenarios, y la integración de la consulta y visualización de resultados en la aplicación [3].

La malla de puntos de ignición es el conjunto de ubicaciones de referencia del sector desde las cuales se simula el inicio de incendios para preparar la biblioteca de escenarios. Su densidad espacial se determinará a partir de la capa georreferenciada «Amenaza por incendios forestales en suelo rural» de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, que clasifica el territorio en amenaza alta, media y baja [6]. Las zonas de mayor amenaza tendrán una mayor densidad de puntos, mientras que en las de menor amenaza estarán más separados; para cada punto se ejecutarán varias simulaciones con distintas condiciones ambientales y parámetros. Esta malla de ubicaciones se distingue de la malla CFD, que discretiza el dominio físico dentro de cada simulación.

Para la consulta, la aplicación obtendrá mediante la API de Open-Meteo datos meteorológicos de la situación actual, que servirán como insumo para buscar el escenario más pertinente entre los disponibles en la biblioteca.

6.2.1. Objetivo general

Desarrollar una primera versión funcional de una aplicación de escritorio que, a partir de escenarios FDS precalculados, permita al comandante o coordinador de las operaciones de emergencia estimar y visualizar la posible propagación de incendios forestales en Aguas Claras, un sector de los Cerros Orientales de Bogotá.

6.2.2. Objetivos específicos

1. Analizar el estado del arte de la simulación de incendios forestales, las capacidades de FDS y otras tecnologías disponibles, las fuentes de datos y las necesidades del proyecto para los Cerros Orientales de Bogotá, con sus resultados consignados en el informe final y en la especificación de requisitos y matriz de trazabilidad.
2. Diseñar la arquitectura de software, la organización de la biblioteca de simulaciones precalculadas y el plan de pruebas, con evidencia en los modelos UML, de acuerdo con los requisitos y el alcance establecidos.
3. Construir la aplicación de escritorio y la biblioteca de escenarios precalculados conforme a la arquitectura diseñada, mediante la preparación de datos y la configuración y ejecución de simulaciones FDS, con el paquete reproducible de configuración y entradas, el informe del piloto, la biblioteca y su catálogo, el código fuente y la versión ejecutable como entregables.
4. Evaluar el producto desarrollado mediante pruebas funcionales y retroalimentación de los usuarios previstos, considerando su comprensión, utilidad percibida y cumplimiento de requisitos, con evidencia en los registros de pruebas, revisiones y evaluaciones, la versión final de la aplicación aceptada por los usuarios y el informe final con demostración.

6.3. Supuestos y Restricciones - Las condiciones que hacen viable el proyecto [Pendientes: 1. Actualizar disponibilidad y preparación de datos. 2. Comprobar recursos HPC.]

La viabilidad del proyecto presupone el acceso a datos territoriales utilizables, una configuración de FDS adecuada al problema y la disponibilidad de capacidad de cómputo y almacenamiento para la biblioteca de escenarios, así como acompañamiento académico y participación de representantes de los usuarios previstos.

Las restricciones principales son el desarrollo de una aplicación de escritorio, el trabajo en un sector territorial delimitado, el calendario académico y la capacidad disponible para generar y almacenar los escenarios precalculados. Como posible restricción sujeta a verificación, la capacidad de procesamiento de HPC-ZINE puede condicionar la ejecución de las simulaciones según los recursos computacionales disponibles para el proyecto.

6.4. Entregables del proyecto - Los siete productos que vamos a entregar [Pendientes: 1. Acordar fechas y cantidades. 2. Precisar destinatarios y responsables de cada entrega.]

El catálogo siguiente conserva la organización de productos empleada en el VFP y la relaciona con las evidencias previstas en la adaptación de estándares. Los identificadores permiten que las demás secciones relacionen actividades, versiones y comprobaciones con cada entregable sin repetir su descripción. La tabla distingue el producto, sus destinatarios y la etapa prevista para su desarrollo [2][3].

Tabla 1: Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2][3].

ID	Producto o descripción	Destinatarios	Momento previsto
E1	Especificación de requisitos, alcance y trazabilidad.	Equipo y director.	Fase de Inicio y refinamiento durante Construcción.
E2	Arquitectura y modelos UML: principalmente diagramas de casos de uso, componentes y despliegue, complementados con diagramas de secuencia y actividades.	Equipo y director.	Diseño inicial y actualizaciones con cada incremento pertinente.
E3	Paquete reproducible de configuración FDS, entradas preparadas e informe del piloto.	Equipo y director.	Preparación del paquete y elaboración del informe tras el desarrollo del piloto.
E4	Biblioteca y catálogo que relacionan escenarios con condiciones geográficas y meteorológicas.	Equipo y director.	Durante Construcción.

ID	Producto o descripción	Destinatarios	Momento previsto
E5	Código fuente y versión ejecutable de la aplicación de escritorio.	Equipo, director y usuarios.	Incrementos durante Construcción y versión corregida en Transición.
E6	Plan y registros de pruebas, revisiones y evaluaciones.	Equipo y director.	Durante el desarrollo en Construcción, con consolidación en Transición.
E7	Manual de instalación y uso, guía técnica e informe final con demostración.	Director y usuarios previstos (bomberos).	Preparación de la entrega y cierre de Transición.

Los documentos de verificación de estándares forman parte de los entregables. La sección 12.3 describe los elementos de configuración y documentación relacionados. La selección de estos estándares representa una adaptación académica a nuestro proyecto [7][8][9][10][11][12][13].

ISO/IEC/IEEE 29148 orienta la especificación y la trazabilidad de los requisitos para relacionar las necesidades con los productos. ISO/IEC/IEEE 12207 organiza los procesos del ciclo de vida del software y su relación con actividades, responsables y evidencias. UML proporciona un lenguaje de modelado para comunicar y revisar el diseño del software. ISO/IEC/IEEE 29119 organiza los procesos, la documentación y las técnicas de pruebas para comprobar el producto y registrar los resultados. IEEE 730 orienta el aseguramiento de la calidad mediante criterios, revisiones y seguimiento de hallazgos [7][8][9][10][11][12][13].

Tabla 2: Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Estándar	Documento de verificación de cumplimiento y relación con entregables
Requisitos: ISO/IEC/IEEE 29148	Especificación, matriz de trazabilidad y registro de cambios de E1, consolidados hasta la entrega final.
Procesos del software: ISO/IEC/IEEE 12207	Matriz de procesos, responsables y evidencias que vincula el PMP con la ejecución de E1 a E7.
Modelado: UML 2.5.1	Modelos versionados de E2 y lista de comprobación de coherencia con requisitos e implementación.
Pruebas: ISO/IEC/IEEE 29119, partes 2, 3 y 4	Plan de pruebas, matriz requisito–caso y registros de ejecución y resultados de E6.
Calidad del software: IEEE 730	Documentación de calidad prevista e informe de seguimiento de E6.

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto - El tiempo y los recursos detrás de la entrega [Pendientes: 1. Elaborar cronograma de 2027-1 con fechas, duraciones, hitos y dependencias. 2. Estimar costos, consultar tarifas HPC-ZINE y consolidar presupuesto y flujo de caja.]

El periodo 2027-1 comprende Construcción y Transición según el ciclo de vida de la sección 8.1. Inicio en 2026-3 aporta la preparación del proyecto. Los productos de referencia se describen en el catálogo de la sección 6.4 [2].

Tabla 3: Marco temporal de referencia. Fuente: metodología del equipo [2].

Periodo	**Fase y orientación**
2026-3	Inicio: preparación del proyecto.
2027-1	Construcción: desarrollo e integración de la aplicación y de la biblioteca.
2027-1	Transición: evaluación, correcciones y entrega académica.

El presupuesto distingue el costo económico del trabajo, el uso de infraestructura y los desembolsos efectivos. Sus rubros de referencia son el trabajo del equipo, el cómputo y almacenamiento HPC, el servidor y las herramientas, y los recursos de evaluación y entrega.

6.6. Evolución del Plan - ¿Cómo cambia el plan cuando cambia el proyecto? [Pendientes: 1. Definir responsables y autoridad de aprobación. 2. Acordar momentos de revisión.]

El PMP relaciona alcance, datos, simulaciones FDS y recursos con las actividades de administración del proyecto. La adaptación de los estándares ISO/IEC/IEEE 29148 [7] e ISO/IEC/IEEE 12207 [8] contempla conservar cambios, decisiones y versiones junto con sus efectos y evidencias. El historial de la sección 1 identifica las modificaciones documentales realizadas.

La gestión de una modificación comenzará con la identificación de la necesidad de cambio y la descripción del ajuste propuesto; a continuación, se evaluará su efecto sobre el alcance, los entregables, los requisitos, los recursos, la calendarización y el presupuesto del proyecto. Este análisis se relacionará con la administración de requerimientos descrita en la sección 10.1.

La propuesta se discutirá en el equipo mediante diálogo y consenso y, de persistir el desacuerdo, mediante votación. A partir de la evaluación y de esa deliberación, se tomará una decisión sobre aceptar, ajustar o descartar la modificación. La aprobación del cambio precederá a su incorporación al plan y distinguirá una propuesta de una modificación autorizada.

Una vez aprobada, la modificación se incorporará en los apartados afectados del PMP y se revisará la coherencia de sus referencias internas y de los documentos relacionados. El historial de cambios identificará la actualización realizada, mientras que el registro de versiones conservará la relación entre el estado anterior y el actualizado.

El cambio aprobado se comunicará al equipo y a las personas que participen en las actividades afectadas, y su implementación se reflejará en el trabajo y en los documentos correspondientes, y se vinculará con el seguimiento del progreso de la sección 10.2 para comprobar que lo realizado corresponda con la decisión aprobada.

Los acuerdos de convivencia y toma de decisiones del equipo se describen en la sección 12.1.

7. Glosario - Un lenguaje común para entendernos

Tabla 4: Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan.

Término	**Significado en el proyecto**
DAD	Disciplined Agile Delivery, enfoque elegido para organizar Inicio, Construcción y Transición de forma iterativa e incremental.
FDS	Fire Dynamics Simulator. Software de simulación empleado para preparar los escenarios de incendio.
WFDS	Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator. Extensión histórica de FDS para incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades se integraron en FDS.
Smokeview	Herramienta seleccionada para presentar las animaciones georreferenciadas de los resultados FDS.
HPC-Zine	Cómputo de alto desempeño e infraestructura universitaria prevista para la ejecución científica.
Biblioteca de escenarios	Conjunto catalogado de resultados precalculados con sus condiciones y límites.
Igniciones de referencia	Puntos de inicio de escenarios con densidad variable guiada por amenaza. No son las celdas de la malla CFD.
Malla CFD	Discretización del dominio físico dentro de cada simulación.
API	Interfaz prevista para obtener información meteorológica desde un servicio externo.
Incremento	Resultado revisable del trabajo, que puede incorporar software o evidencia técnica.
WBS	Estructura de descomposición del trabajo que relaciona productos y actividades.
Línea base	Versión identificada que se acuerda como referencia para estudiar y controlar cambios.
BPMN	Notación para describir procesos.
UML	Lenguaje de modelado para representar y describir sistemas de software.
Cliente o usuario	Persona con quien se acuerdan las necesidades y la aceptación del producto. Su identificación no presupone una institución contratante.

8. Contexto del proyecto - ¿Cómo vamos a trabajar y con quién?

8.1. Modelo de Ciclo de Vida - Preparar, construir y entregar con DAD [Pendientes: 1. Acordar duración y agenda de iteraciones. 2. Definir flujo de revisión. 3. Definir las prácticas que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto, incluidas las técnicas de seguimiento, desarrollo y pruebas.]

El proyecto utilizará DAD con las fases de Inicio, Construcción y Transición. Inicio aporta la delimitación, los requisitos y las primeras decisiones sobre arquitectura, datos y viabilidad, mientras que Construcción integra desarrollo de software y trabajo técnico mediante incrementos y Transición reúne la evaluación, las correcciones y la entrega. Esta secuencia no impide revisar decisiones previas cuando aparezca evidencia relevante. Por el contrario, las pruebas, la trazabilidad y la gestión de riesgos acompañarán el desarrollo, de manera que las incertidumbres sobre ejecución, datos o agregación puedan tratarse antes de comprometer la versión final [2].

La figura 1 representa la relación entre las fases del ciclo de vida. Una iteración seleccionará un objetivo verificable, desarrollará el trabajo necesario, conservará sus comprobaciones y revisará el resultado para decidir la continuidad. Un incremento podrá producir una capacidad de la aplicación o evidencia que permita ajustar parámetros, datos o límites, por lo que el avance no se medirá únicamente por código escrito. El catálogo de entregables se presenta en la sección 6.4, la base de aceptación en la sección 8.3 y los fundamentos de seguimiento y medición en las secciones 10.2 y 12.4.

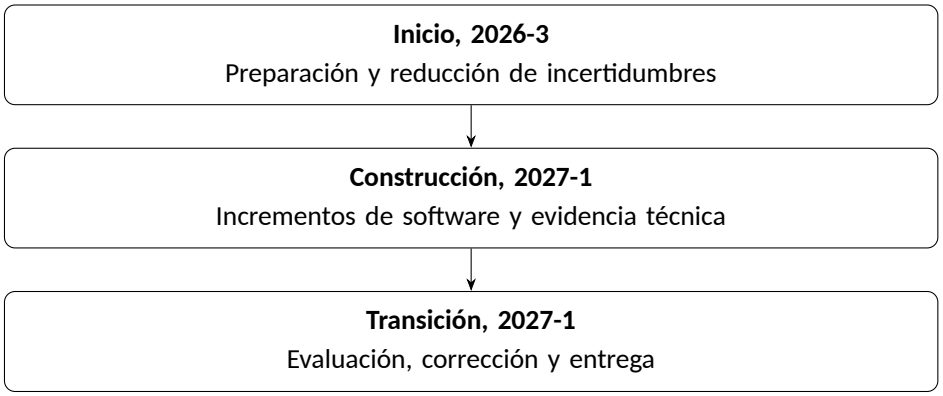


Figura 1: Ciclo de vida adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2].

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué pasamos de RUP a DAD? [Pendientes: 1. Completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles. 2. Definir y documentar las prácticas específicas de desarrollo que se utilizarán en el proyecto.]

Rational Unified Process (RUP) fue considerado inicialmente por su naturaleza iterativa e incremental y su orientación a la arquitectura, características apropiadas para desarrollar la aplicación, construir la biblioteca de escenarios e integrar sus distintos componentes. Posteriormente se op-

tó por DAD como una alternativa más reciente que conserva estas características pertinentes y permite adaptar la forma de trabajo a las necesidades del proyecto.

La elección de DAD responde a la necesidad de coordinar un producto de software con incertidumbres que no se resuelven únicamente mediante programación, puesto que la aplicación depende de decisiones sobre las entradas del simulador, su ejecución, el catálogo de escenarios y la aproximación espacial, por lo que revisar prioridades y obtener evidencia técnica desde las primeras iteraciones resulta coherente e importante para el trabajo previsto. La adaptación registrada conserva fases reconocibles y, al mismo tiempo, distribuye las pruebas, la arquitectura y la documentación entre las iteraciones; de este modo, la justificación de DAD frente a la alternativa inicialmente considerada se apoya en su adaptación al contexto y en la relación entre incertidumbre y resultados verificables [2].

8.2. Lenguajes y Herramientas - Las herramientas que conectan simulación y software [Pendientes: 1. Elegir tecnologías de aplicación y pruebas y proveedor de API. 2. Fijar versiones. 3. Configurar repositorio y reglas de Git. 4. Confirmar acceso documental definitivo y recursos HPC. 5. Buscar y recopilar referencias bibliográficas oficiales, manuales de usuario y documentación técnica de todas las herramientas y lenguajes utilizados, incluidos FDS, Smokeview, UML, Git, GitHub, Aldine, LaTeX, Docker Compose, Nginx, Tailscale, Linux y Slurm.]

1. **Simulación.** FDS es el software utilizado para preparar los escenarios de incendio mediante simulaciones, según la convención FDS/WFDS de la sección 6.1. La documentación oficial *Installing and Running FDS on a Linux Cluster* describe su instalación y ejecución en clústeres Linux, incluye ejemplos con el gestor de trabajos Slurm y permite acceder al repositorio oficial del software [14]. Esta base tecnológica es acorde con el entorno Linux, Slurm y la arquitectura x86 de la infraestructura HPC-Zine prevista para el proyecto; la correspondencia general entre estas tecnologías se distingue de la comprobación de su instalación, configuración y ejecución efectiva en ese recurso.

2. **Visualización.** Smokeview es el visualizador previsto para presentar los resultados de FDS mediante las animaciones georreferenciadas de los escenarios.

3. **Modelado.** UML 2.5.1 proporciona el lenguaje para representar y comunicar el diseño del software [12].

4. **Control de versiones y conservación.** Git conserva las versiones del código de la aplicación y los repositorios documentales por proyecto.

5. **Documentación.** Aldine centraliza la elaboración colaborativa de los documentos y la bibliografía del proyecto; LaTeX es el lenguaje empleado para estructurar esos documentos.

6. **Infraestructura y administración.** Docker Compose organiza los contenedores de aplicación y compilador del servidor documental; Nginx actúa como gateway y Tailscale permite el acceso al servidor documental entre los miembros del equipo y el director del proyecto.

Este computador está ubicado en casa de Daniel y dispone de almacenamiento persistente. Para la ejecución científica, HPC-Zine es la infraestructura prevista, Linux es el entorno de ejecución y Slurm gestiona los trabajos de simulación. Los ámbitos de infraestructura se describen en la sección 9.2.2 [14].

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué elegimos FDS, UML, Aldine y Git? [Pendientes: 1. Actualizar el análisis de alternativas y justificación conforme a la resolución del pendiente 1 de la sección 8.2. 2. Investigar y comparar alternativas a UML. 3. Investigar y comparar alternativas a Git.]

1. **FDS.** Es el software de simulación elegido para preparar los escenarios de incendio y su uso se relaciona con la representación física del problema y con el alcance y las restricciones descritos en las secciones 6.2 y 6.3. Incluso considerando condiciones de entrada comparables, FDS constituye una opción más adecuada para los objetivos del proyecto que FARSITE debido a su mayor nivel de detalle en la representación física del incendio, frente al enfoque más simplificado de FARSITE.

2. **UML.** Se seleccionó por ser un lenguaje de modelado ampliamente reconocido, que aporta convenciones compartidas para comunicar el diseño, y porque el equipo posee conocimientos y experiencia en su utilización como parte de su formación en Ingeniería de Sistemas [12].

3. **Aldine.** Se seleccionó frente a Overleaf por sus menores restricciones económicas para el equipo, su mayor libertad de edición y la posibilidad de centralizar y almacenar los documentos del proyecto en un entorno propio, mediante el servidor del equipo.

4. **Git.** Permite conservar la evolución del código y relacionar cambios con versiones del producto. Se seleccionó porque el equipo conoce la herramienta y su manejo forma parte de su formación en Ingeniería de Sistemas [2].

8.3. Plan de Aceptación del Producto - Comprobar el producto con quienes lo usarán [Pendientes: 1. Hablar con la directora de Bomberos de Bogotá para acordar su participación en la aceptación del producto. 2. Acordar criterios medibles, métodos de comprobación, tolerancias y responsables.]

La metodología contempla evaluación con usuarios en Transición, y la adaptación de estándares aporta requisitos verificables, trazabilidad y registros de pruebas como base para evaluar los resultados del producto [2][3][7][9][10].

El catálogo de la sección 6.4 identifica los entregables de referencia para esta evaluación.

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación - Las personas que harán posible el proyecto

8.4.1. Interfaces Externas - El vínculo con usuarios, academia y HPC [Pendientes: 1. Confirmar participación de John Jairo Corredor Franco. 2. Identificar usuarios evaluadores. 3. Precisar los datos de contacto y medios de comunicación de todas las personas y entidades participantes.]

1. **Jaime Andrés Pavlich Mariscal, director del proyecto.** Aporta acompañamiento académico al desarrollo del proyecto de grado.
2. **Juan Guillermo Torres Hurtado, coordinación de HPC-ZINE.** Atiende las condiciones de acceso a cómputo y la comunicación sobre capacitación y recursos.
3. **Andrés Oswaldo Calderón Romero, asesor del proyecto.** Aporta acompañamiento técnico al desarrollo del proyecto de grado.
4. **Usuarios.** Representan la perspectiva del comandante o coordinador de la operación de emergencia.

Tabla 5: Participantes externos y ámbitos de relación. Fuente: identificación de participantes del proyecto.

Persona o entidad	**Relación con el proyecto**	**Canal de comunicación**
Jaime Andrés Pavlich Mariscal	Director del proyecto de grado y acompañamiento académico.	
Juan Guillermo Torres Hurtado	Coordinación de HPC-ZINE y comunicación sobre capacitación y recursos.	
Andrés Oswaldo Calderón Romero	Asesor del proyecto de grado y acompañamiento técnico.	
Usuarios	Perspectiva de uso del comandante o coordinador de la operación de emergencia.	WhatsApp

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles - ¿Quién se ocupa de cada responsabilidad? [Pendientes: 1. Designar coordinador. 2. Elaborar organigrama. 3. Asignar actividades, revisiones, medición y riesgos.]

Andrés Felipe Pinzón Márquez, Daniel Felipe Ramirez Vargas, Guillermo Andrés Aponte Cardenas y Miguel Ángel Sarmiento Cuervo conforman el equipo de trabajo. La organización prevista comprende un coordinador y los demás integrantes con participación multitarea, sin una distribución permanente por especialidades.

Aunque todos los integrantes del equipo participan en distintas actividades del proyecto, se establecen las siguientes responsabilidades particulares:

- **Andrés Felipe Pinzón Márquez.**
- **Daniel Felipe Ramírez Vargas.** Es responsable de la administración y el mantenimiento del servidor documental utilizado para la elaboración colaborativa de los documentos del proyecto.
- **Guillermo Andrés Aponte Cardenas.**
- **Miguel Ángel Sarmiento Cuervo.**

9. Administración del Proyecto - Convertir el alcance en un plan de trabajo

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación - Estimar antes de comprometer tiempo y recursos [Pendientes: 1. Identificar las estimaciones requeridas en las diferentes secciones del PMP. 2. Definir los métodos y herramientas que se utilizarán para realizar cada estimación. 3. Documentar los datos, supuestos y procedimientos que fundamentarán los cálculos realizados.]

9.2. Inicio del proyecto - Prepararnos antes de construir

9.2.1. Entrenamiento del Personal - Aprender FDS y prepararnos para usar HPC [Pendientes: 1. Confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC. 2. Acordar agenda, tareas, criterios de aprendizaje, evidencia y revisión.]

Todos los integrantes asistirán a la capacitación de HPC-Zine y aprenderán FDS de manera autodidacta. La capacitación se relaciona con el acceso y uso de la infraestructura universitaria descrita en la sección 9.2.2 [2].

El aprendizaje autodidacta de FDS toma como referencia la guía oficial de usuario del simulador [15] y se organiza en cuatro etapas consecutivas:

Etapa 1. **Uso básico del simulador.** Comprender la estructura de los archivos de entrada, ejecutar simulaciones y visualizar resultados mediante Smokeview.

Etapa 2. **Propagación del incendio.** Estudiar la representación de combustibles, transferencia de calor y procesos de ignición.

Etapa 3. **Incorporación de variables complejas.** Aprender a introducir condiciones ambientales y físicas, principalmente viento y vegetación.

Etapa 4. **Automatización de escenarios.** Generar simulaciones automáticamente mediante la variación de coordenadas de ignición, condiciones ambientales y otros parámetros relevantes.

9.2.2. Infraestructura - El entorno para ejecutar nuestras simulaciones [Pendientes: 1. Confirmar acceso, cuotas, almacenamiento y tarifas HPC-ZINE. 2. Verificar versión, instalación, configuración y ejecución efectiva de FDS en HPC-Zine. 3. Elegir sistema operativo y entornos de desarrollo de la aplicación. 4. Investigar y precisar los procedimientos, requisitos y actividades necesarios para obtener acceso individual a HPC-Zine.]

Para desarrollar y ejecutar las simulaciones del proyecto, se prevé utilizar HPC-Zine como infraestructura universitaria de cómputo científico.

Juan Guillermo Torres Hurtado es la persona de contacto para la coordinación de HPC-ZINE. La infraestructura científica comprende entornos de ejecución de FDS, cómputo y almacenamiento.

Para obtener y habilitar el uso de HPC-Zine, todos los integrantes del equipo asistirán a la capacitación, conocerán las políticas de uso de la infraestructura, completarán la formación sobre Slurm y cumplirán los demás requisitos institucionales que se establezcan. Cada integrante realizará personalmente estas actividades de capacitación y habilitación, dado que dispondrá de un acceso independiente y será responsable de su utilización.

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto - Organizar las actividades para llegar a la entrega [Pendientes: 1. Completar planificación de 2027-1.]

9.3.1. Descomposición de Actividades - Descomponer el trabajo de una iteración [Pendientes: 1. Elaborar el WBS de 2027-1 para una iteración y establecer sus dependencias.]

Las doce actividades principales del proyecto permiten desarrollar y comprobar los entregables definidos en el catálogo de la sección 6.4, en relación con la metodología del proyecto [2][3]. La tabla presenta una descripción general del trabajo.

Tabla 6: Actividades principales del proyecto y su descripción. Fuente: elaboración propia.

Actividad	**Descripción**
1. Definir el alcance	Revisar entrevistas, precisar el flujo principal de la aplicación, delimitar el sector de los Cerros Orientales y definir los requisitos.
2. Definir arquitectura y preparar datos	Describir los componentes de la solución y sus conexiones, e identificar, recolectar y preparar los datos necesarios.
3. Organizar el trabajo	Priorizar tareas, asignar responsables, organizar riesgos, iniciar el aprendizaje de FDS y coordinar los recursos HPC.
4. Planificar calidad y pruebas	Definir los aspectos que se evaluarán, los criterios, responsables y momentos de revisión, así como las pruebas y sus registros.
5. Ejecutar el piloto	Preparar las entradas de FDS, ejecutar el caso piloto, comprobar su funcionamiento y conservar los parámetros necesarios para reproducirlo.
6. Generar escenarios	Ejecutar las simulaciones seleccionadas utilizando HPC-Zine, clasificar los resultados y almacenarlos para construir la biblioteca.
7. Desarrollar la aplicación	Implementar la consulta de escenarios e integrar las condiciones meteorológicas, búsqueda, agregación, visualización y conexión con la biblioteca.
8. Comprobar y corregir	Probar los componentes individuales y sus integraciones, identificar problemas, aplicar correcciones y verificar los resultados.
9. Evaluar la versión final	Realizar pruebas con usuarios, incluidos bomberos, observar la interpretación de los resultados y recopilar observaciones.
10. Corregir problemas	Asignar los problemas identificados, implementar los ajustes correspondientes y comprobar la versión corregida.
11. Preparar la entrega	Reunir código, dependencias, datos e instrucciones, y preparar el manual, la guía técnica y una demostración reproducible.

Actividad	Descripción
12. Consolidar evidencias	Relacionar los requisitos con la implementación y sus comprobaciones, consolidando la matriz de trazabilidad y el informe de calidad.

9.3.2. Calendarización - Dar orden y tiempo al trabajo [Pendientes: 1. Elaborar la carta Gantt de 2027-1 con fechas, duraciones y dependencias, detallando las actividades repetitivas de una sola iteración, y elaborar un diagrama BPMN para representar el flujo recurrente de trabajo. 2. Acordar iteraciones, agenda, revisiones y periodos de corrección. 3. Establecer la actualización de la carta Gantt en cada entrega para reflejar el avance real del proyecto.]

9.3.3. Asignación de Recursos - Vincular cada actividad con los recursos que necesita [Pendientes: 1. Una vez elaborada la WBS, identificar los recursos necesarios y los roles requeridos para ejecutar cada actividad principal.]

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación - ¿Cuánto cuesta realizar el proyecto? [Pendientes: 1. Consultar y confirmar las tarifas de HPC-Zine. 2. Valorar esfuerzos y aportes financieros y en especie por actividad. 3. Elaborar y justificar el presupuesto. 4. Elaborar una tabla de flujo de caja que detalle las entradas y salidas de dinero para las principales actividades identificadas en la WBS.]

10. Monitoreo y Control del Proyecto - Saber dónde estamos y qué debemos ajustar

10.1. Administración de Requerimientos - Mantener conectadas las necesidades y el producto [Pendientes: 1. Consolidar los objetivos y requisitos a partir del VFP. 2. Definir los participantes, responsabilidades, autoridad de aprobación y momentos de revisión de cambios. 3. Elaborar un diagrama BPMN que represente el proceso de administración de requerimientos y la creación o actualización de sus artefactos.]

La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148 contempla una especificación de requisitos que se mantiene actualizada durante el desarrollo del proyecto, una matriz de trazabilidad y un registro de cambios para conservar el origen, las características y las comprobaciones de los requisitos. Las necesidades identificadas en entrevistas se distinguen de las funciones incorporadas al alcance, de modo que una recomendación conserve su procedencia sin convertirse automáticamente en un compromiso de implementación [2][7].

ISO/IEC/IEEE 29148 orienta la evaluación del impacto, la revisión y la aprobación de los cambios, junto con la conservación de la trazabilidad y de las versiones. En el proyecto, estas prácticas se aplicarán a los requisitos de la aplicación y de su biblioteca de escenarios mediante el siguiente procedimiento [7]:

1. **Detectar y reportar la necesidad.** La revisión de entrevistas y del VFP, las pruebas y la evaluación con usuarios pueden revelar necesidades nuevas, errores o ajustes de los requisitos. La propuesta se comunicará al equipo y se incorporará al registro de cambios, identificando el requisito afectado, su origen, la justificación y la modificación solicitada.

2. **Evaluar el impacto.** La matriz de trazabilidad permitirá localizar los requisitos relacionados, componentes y casos de prueba afectados. Se examinarán la claridad, coherencia, viabilidad y posibilidad de comprobar el requisito propuesto, junto con sus efectos sobre el alcance, el esfuerzo, los recursos, la calendarización y la calidad del producto.

3. **Decidir y registrar.** La revisión de la propuesta conducirá a su aprobación o rechazo, conservando la decisión y su justificación en el registro de cambios. La discusión se apoyará en los acuerdos de toma de decisiones de la sección 12.1; la incorporación del cambio al producto estará precedida por su aprobación.

4. **Incorporar el cambio aprobado.** Se actualizarán la especificación de requisitos, la matriz de trazabilidad y el registro de cambios, conservando la relación entre la versión anterior y la nueva. El ajuste se reflejará en el diseño, la implementación y las pruebas afectadas; si la propuesta se rechaza, se conservará el requisito vigente junto con el motivo de la decisión.

5. **Comunicar y comprobar.** La decisión se comunicará a los integrantes y usuarios afectados. Los cambios aprobados se implementarán y comprobarán mediante los casos relacionados, registrando la versión evaluada y los resultados. Su avance se incorporará al seguimiento de la sección 10.2; cuando la modificación afecte al PMP, se relacionará también con el proceso de evolución del plan de la sección 6.6.

10.2. Monitoreo y Control de Progreso - Seguir el avance con requisitos, tareas y pruebas [Pendientes: 1. Acordar los responsables del monitoreo y control del progreso. 2. Definir las métricas y unidades de seguimiento del proyecto y relacionarlas con los métodos de estimación de la sección 9.1 una vez completada. 3. Establecer las acciones correctivas ante desviaciones del progreso, sus responsables y los procedimientos para su aplicación y seguimiento, en relación con la sección 8.4.2.]

El seguimiento cuenta como base con los documentos previstos para evaluar la aplicación de estándares. Estos permiten relacionar el trabajo planificado, los resultados obtenidos y las evidencias que los respaldan, distinguiendo una actividad realizada de una condición verificada. Los estándares orientan los procesos y la conservación de evidencias; la selección de indicadores y la asignación de funciones corresponden a su adaptación al proyecto [2][7][8][9][13].

1. **ISO/IEC/IEEE 29148.** La especificación, la matriz de trazabilidad y el registro de cambios permiten relacionar cada requisito con su implementación y comprobación. Su revisión ayuda a determinar qué necesidades se han atendido, qué resultados tienen evidencia y cómo los cambios afectan el trabajo previsto [7].
2. **ISO/IEC/IEEE 12207.** El proceso de evaluación y control del proyecto orienta la comparación de los resultados con lo planificado, el análisis de desviaciones, la comunicación del estado y las acciones de corrección o replanificación. La matriz de procesos, integrantes y evidencias aporta la relación entre actividades y resultados para efectuar esa revisión [2][8].
3. **ISO/IEC/IEEE 29119.** El monitoreo y control de pruebas contempla recopilar y registrar mediciones y comparar la ejecución con lo planificado, identificando obstáculos y comunicando resultados y medidas de control. En el proyecto se utilizarán el plan de pruebas, la matriz requisito–caso y los registros de ejecución y resultados de E6 para examinar el progreso de las comprobaciones del producto [2][9].
4. **IEEE 730.** El aseguramiento de calidad permite revisar si las actividades y mediciones se ejecutan conforme a lo planificado y conservar los hallazgos y su tratamiento. El informe de calidad relacionará los problemas con sus evidencias, las acciones aplicadas y la nueva comprobación, para evaluar la calidad de los resultados junto con el avance del trabajo [2][13].

La base de medición considera la implementación de requisitos, la terminación de tareas y los resultados de pruebas. Sus indicadores de referencia se expresan en conteos y se relacionan con evidencias identificables:

La recopilación del progreso se apoyará en los resultados de las actividades, las versiones de sus productos, la matriz de trazabilidad y los registros de pruebas. Se registrará la relación entre actividad, resultado observado y evidencia. Los resultados del seguimiento y las decisiones de control se comunicarán al equipo, al director y a las personas afectadas por los ajustes [8][9][13].

Ante una desviación, se identificará la diferencia entre lo previsto y lo observado, su causa y sus efectos sobre el trabajo. La evaluación permitirá decidir entre corregir el producto o sus comprobaciones, reorganizar actividades o revisar la planificación. Se registrarán la decisión, la acción y

Tabla 7: Indicadores de referencia para el seguimiento del progreso. Fuente: adaptación al proyecto de las dimensiones de seguimiento.

Indicador	**Unidad y evidencia**
Requisitos implementados	Número de requisitos con implementación identificable, vinculados a la especificación y a la matriz de trazabilidad. La implementación se distingue de su comprobación.
Tareas completadas	Número de tareas terminadas respecto de las planificadas para la iteración, con producto o evidencia de ejecución.
Resultados de pruebas	Número de casos ejecutados y sus resultados satisfactorios o no satisfactorios, vinculados a la versión evaluada y a los registros de ejecución.

el resultado esperado; las responsabilidades de decisión, ejecución y comprobación se vincularán con los roles de la sección 8.4.2. Si la respuesta modifica requisitos, se aplicará el proceso de la sección 10.1; si modifica el PMP, se seguirá la evolución del plan descrita en la sección 6.6.

La resolución se comprobará mediante una nueva medición, revisión o ejecución de pruebas pertinente a la desviación y se conservará la evidencia del resultado. El seguimiento contrastará ese resultado con el efecto esperado de la acción y registrará su cierre o la necesidad de una nueva medida, manteniendo la relación entre el problema, la decisión y la comprobación [8][13].

10.3. Cierre del Proyecto - Evaluar, corregir y cerrar la entrega [Pendientes: 1. Confirmar fechas y responsables.]

La metodología DAD contempla cierres de fase con productos y criterios de cumplimiento. En particular, la transición comprende evaluación, correcciones, documentación final y entrega. Las evidencias de los estándares y el catálogo de la sección 6.4 aportan la base documental del cierre [2][3][8][13].

1. **Evaluación.** Contrastar la versión final de la aplicación con las necesidades y los criterios de aceptación mediante la participación de los usuarios previstos, especialmente los bomberos.
2. **Correcciones.** Atender las observaciones y los problemas identificados durante la evaluación con los usuarios y comprobar los ajustes realizados.
3. **Documentación final.** Consolidar los manuales, la guía técnica, los registros de pruebas, las evidencias y los demás documentos correspondientes a la entrega.
4. **Entrega.** Preparar y presentar la versión final de la aplicación, la biblioteca de escenarios y la documentación correspondiente a sus destinatarios.

La base de evaluación con usuarios se presenta en la sección 8.3.

11. Entrega del Producto - Entregar la aplicación, la biblioteca y su documentación [Pendientes: 1. Acordar las fechas y el medio de entrega. 2. Definir el procedimiento y los responsables del empaquetado y la presentación.]

La entrega corresponde a la fase de Transición e integra la versión evaluada de la aplicación, la biblioteca y los documentos del catálogo de la sección 6.4. Las instrucciones de instalación y uso, la demostración y el informe final acompañan estos productos, mientras que los registros de E6 relacionan las pruebas, las revisiones y las evaluaciones [2][8].

12. Procesos de Soporte - Cuidar el trabajo que sostiene el producto

12.1. Ambiente de Trabajo - Trabajar juntos también requiere acuerdos

El propósito del equipo es aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y unir esfuerzos para desarrollar un trabajo de calidad. Sus valores son responsabilidad, compromiso, sinceridad, comunicación y empatía, y sus prioridades sitúan la calidad sobre la rapidez, la comunicación sobre la imposición y la responsabilidad sobre la procrastinación. La iniciativa, el reconocimiento de errores y los aportes de cada integrante deben acompañarse de comunicación asertiva y consideración por el trabajo común, de manera que una dificultad individual pueda tratarse oportunamente como un problema que el equipo ayuda a resolver.

Las decisiones se tomarán mediante diálogo y consenso, y cuando persista el desacuerdo se recurrirá a votación. En caso de empate, el grupo debatirá para argumentar las posturas frente a validación externa, sin atribuir de antemano esa validación a una persona que no haya aceptado intervenir. Las reuniones serán presenciales o virtuales, previamente acordadas y con un objetivo que permita revisar avances, dificultades o entregas. También se establecerán plazos internos anteriores a los institucionales para revisar y corregir, respetando los horarios, compromisos y actividades individuales.

La retroalimentación será respetuosa, reconocerá aspectos positivos e identificará oportunidades de mejora, buscando soluciones conjuntas y asumiendo el error como una posibilidad de aprendizaje colectivo. El equipo también promoverá espacios de convivencia y confianza para conocer habilidades y facilitar la participación de todos.

Guillermo Aponte será el encargado de supervisar el cumplimiento de las reglas de convivencia, comunicación y trabajo colaborativo del equipo.

12.2. Análisis y Administración de Riesgos - Anticipar lo que puede poner en riesgo la entrega [Pendientes: 1. Elaborar la descripción del plan de administración de riesgos, indicando el responsable y las actividades necesarias para ejecutarlo. 2. Elaborar un diagrama BPMN del proceso de administración de riesgos y su correspondiente explicación. 3. Elaborar una tabla con los riesgos identificados, indicando su probabilidad de ocurrencia e impacto, y ordenándolos por prioridad a partir de ambos factores. 4. Elaborar una segunda tabla con los riesgos más importantes y las acciones de prevención correspondientes a cada uno. 5. Considerar en la identificación de riesgos las incertidumbres relacionadas con los datos de entrada, la ejecución de FDS, el acceso y capacidad de HPC-Zine y la comprobación de la agregación de escenarios.]

La adaptación de ISO/IEC/IEEE 12207 incluye gestión de riesgos y conservación de decisiones y evidencias [2][8].

12.3. Administración de Configuración y Documentación - Conservar versiones coherentes de nuestros artefactos [Pendientes: 1. Definir cambios, ramas, versiones, integración, nomenclatura y almacenamiento pesado. 2. Asignar administración, revisión, aprobación y restauración. 3. Comprobar servicio y recuperación y definir respaldo del repositorio de la aplicación.]

Los elementos de configuración comprenden código, documentos, modelos, datos preparados y catálogo [2][8].

Para los documentos de Aldine, la documentación del servidor describe repositorios Git por proyecto y sincronización unidireccional hacia un repositorio consolidado en GitHub. El esquema conserva las fuentes y el PDF principal compilado y excluye repositorios internos y auxiliares de compilación; dispone de activación manual y de un temporizador aproximadamente cada cuatro horas. La identidad de los commits automáticos es Aldine y se distingue de la autoría individual de los contenidos.

Tabla 8: Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Artefacto	**Creación o refinamiento**	**Información para mantener el artefacto actualizado y coherente**
Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148)	Al precisar requisitos y al aprobar cambios durante el desarrollo.	Origen, versión y relaciones con diseño y prueba.
Procesos del software (ISO/IEC/IEEE 12207)	Al planificar actividades y al registrar su ejecución.	Responsable, producto y evidencia.
Modelado UML	En decisiones de arquitectura y cambios de interfaces o implementación.	Revisión de coherencia entre vistas.
Pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119)	Al planificar pruebas y después de cada ejecución o corrección.	Caso, entradas, versión y resultado.
Calidad del software (IEEE 730)	Al preparar revisiones y tratar hallazgos de cada versión.	Criterio, problema, acción y reevaluación.
Código de E5	En cada incremento que modifique el producto.	Git y comprobaciones asociadas.
Datos, entradas y resultados de E3-E4	Al preparar, ejecutar, revisar o incorporar un escenario.	Procedencia, unidades, configuración e inventario.

12.4. Métricas y Proceso de Medición - Medir lo que hacemos para orientar las decisiones

Los estándares seleccionados aportan la base para medir y comprobar el trabajo, pues ISO/IEC/IEEE 29148 contempla requisitos y trazabilidad, ISO/IEC/IEEE 12207 relaciona actividades con integrantes y evidencias, ISO/IEC/IEEE 29119 documenta las pruebas e IEEE 730 utiliza criterios y hallazgos para evaluar productos y procesos [2][7][8][9][10][13].

La aplicación de estos procedimientos se apoyará en los artefactos del catálogo de la sección 6.4 y en el seguimiento de la sección 10.2.

ISO/IEC/IEEE 29148 en la medición de requisitos. El procedimiento comprende preparar la medición y realizarla, lo que implica identificar las necesidades de información, seleccionar las medidas pertinentes y establecer cómo se recopilarán, analizarán y comunicarán los datos; después, recopilar, almacenar y verificar esos datos, analizarlos y registrar e informar los resultados. En el proyecto, la especificación, la matriz de trazabilidad y el registro de cambios permitirán identificar los requisitos y la versión a la que corresponde cada observación. El conteo de requisitos implementados se obtendrá de sus relaciones con la implementación; las relaciones con los casos de prueba y sus resultados permitirán distinguir esa implementación de su comprobación.

ISO/IEC/IEEE 12207 en la preparación y ejecución de la medición. El proceso orienta identificar y priorizar las necesidades de información, seleccionar y especificar medidas, organizar la obtención y el acceso a los datos y establecer criterios para evaluar la información y el propio proceso. Su ejecución integra la recopilación en las actividades del proyecto, verifica y conserva los datos, los analiza y comunica los resultados para apoyar decisiones. Esta secuencia se aplicará a los conteos de requisitos implementados, tareas completadas y resultados de pruebas descritos en la sección 10.2, conservando su vínculo con las actividades, los productos y las evidencias de ejecución. Al interpretar los resultados se comprobará que correspondan al trabajo y a la versión examinados; la información obtenida alimentará el seguimiento y las decisiones de corrección, reorganización o revisión de la planificación de esa sección. Estos indicadores constituyen la adaptación del proyecto y no una lista de métricas impuesta por el estándar [2][8].

ISO/IEC/IEEE 29119 en el monitoreo, control y documentación de pruebas. El procedimiento comienza con la identificación de las medidas y los medios para observar el progreso y los riesgos de las pruebas. Continúa con la recopilación y el registro de mediciones, su comparación con lo planificado y la identificación de desviaciones, obstáculos y cambios de riesgo; a partir de ello se determinan y comunican medidas de control, se actualiza el plan cuando corresponda y se comprueba el cumplimiento de los criterios de terminación antes de aprobar el cierre de las pruebas.

IEEE 730 en la comprobación de las mediciones y el tratamiento de hallazgos. El procedimiento de aseguramiento de calidad orienta a identificar los estándares y procedimientos aplicables. Cuando se detectan diferencias frente a lo esperado, se registran y siguen las no conformidades, se evalúan las respuestas y se comprueba nuevamente el resultado después de los cambios. En el proyecto, las revisiones comprobarán contra los datos y registros de requisitos, tareas y pruebas con sus evidencias 10.2 [2][13].

12.5. Control de Calidad - Revisar y comprobar lo que vamos construyendo [Pendientes: 1. Identificar, describir y explicar los procesos de control y aseguramiento de calidad que se aplicarán al proyecto, incluyendo verificación, validación, revisiones, auditorías, revisiones de calidad de documentos, pruebas unitarias, pruebas de sistema y evaluaciones externas, entre otros. 2. Elaborar una tabla que presente cada proceso de calidad, su nombre, una breve descripción y el momento del proyecto en que se realizará. 3. Describir detalladamente el procedimiento de cada proceso de calidad mediante diagramas BPMN. 4. Establecer los responsables de ejecutar, supervisar y comprobar cada proceso de calidad.]

El control de calidad tiene como base la adaptación de estándares ya trabajada por el equipo: IEEE 730 orienta el aseguramiento de calidad de productos y procesos, ISO/IEC/IEEE 29148 aporta criterios de requisitos y trazabilidad, UML permite revisar los modelos y ISO/IEC/IEEE 29119 organiza procesos, documentación y técnicas de prueba. Los documentos de evaluación previstos en la sección 6.4 son evidencias para comprobar esa aplicación y no una certificación de conformidad [2][7][9][10][11][12][13].

La metodología incluye pruebas continuas, revisión de documentos y datos, casos reproducibles y evaluación con usuarios. La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29119 recoge técnicas como particiones de equivalencia, valores límite y tablas de decisión, mientras que la de IEEE 730 contempla criterios, hallazgos y su tratamiento. La ejecución correcta del software no demuestra por sí sola validez territorial ni valida la agregación, y la coincidencia de resultados no se interpreta como probabilidad calibrada [2].

13. Anexos - El material que complementa nuestro plan [Pendientes: 1. Revisar documentos HTML para anexar.]

14. Referencias - Las fuentes que dan sustento al documento

[1] Pontificia Universidad Javeriana, “Plantilla de plan de administración de proyecto.” Material del curso. Archivo aportado: SPMP-Plantilla.pdf.

[2] Equipo del proyecto, “Adaptación de estándares y metodología del proyecto de simulación de incendios,” 2026. Presentación interna de la asignatura de Planeación de Proyecto de Grado: Presentacion-Adaptacion-Estandares.html, revisada el 23 de octubre.

[3] Equipo del proyecto, “Propuesta para trabajo de grado: aplicación de apoyo a la decisión para incendios en los cerros orientales de bogotá,” 2026. Versión de trabajo del 26 de octubre.

[4] National Institute of Standards and Technology, “Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV).” `https://pages.nist.gov/fds-smv/index.html`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[5] USDA Forest Service, “Wildland Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS).” `https://research.fs.usda.gov/pnw/projects/wfds`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[6] Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, “Amenaza por incendios forestales en suelo rural.” SINUPOT, POT, Decreto 555 de 2021, capa 40, servicio ArcGIS REST, 2021. Disponible en: `https://sinu.sdp.gov.co/serverp/rest/services/POT555/AMENAZAS_Y_RIESGOS/MapServer/40`.

[7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE, 2018. Copia digital conservada en el proyecto.

[8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2026 — Systems and software engineering—Software life cycle processes*. ISO/IEC/IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[9] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[10] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[11] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[12] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. OMG, 2017. Documento formal/2017-12-05. Copia digital conservada en el proyecto.

[13] IEEE, *IEEE 730-2026 — IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*. IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[14] K. McGrattan, “Installing and Running FDS on a Linux Cluster.” `https://github.com/firemodels/fds/wiki/Installing-and-Running-FDS-on-a-Linux-Cluster`, 2022. Documentación oficial de FDS, wiki del repositorio firemodels/fds. Actualizada el 31 de mayo de 2022. Consultada el 28 de octubre de 2026.

[15] K. McGrattan, S. Hostikka, J. Floyd, R. McDermott, M. Vanella, E. Mueller, and C. Paul, "Fire Dynamics Simulator User's Guide," NIST Special Publication 1019, National Institute of Standards and Technology, Oct. 2013. Sexta edición. Revisión FDS-6.11.1-0-gff928db, 10 de julio de 2026. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1019.
